

宮L整備第551-1号

平成31年2月15日

衆議院議員 福田 昭夫 様

宇都宮市長 佐藤 栄一

(建設部LR T整備課扱)

「公開再質問状」について (回答)

平成31年2月8日付でご質問いただきました標記の件につきましては、別添のとおり、回答いたします。

平成31年2月8日付公開再質問状に対する回答

1 質問「1」

- ・ (1)について

交渉の記録は情報を共有するための文書であり、本市の意思を決定するための決裁文書ではないことから、起案者、起案日、決裁日は設けておりません。

- ・ (2)について

交渉の記録を速やかに作成後、今後の業務遂行に必要な情報を共有すべき役職者に供覧をいたしました。

- ・ (3)について

交渉の記録につきましては、交渉内容に応じて、関係課に供覧をしております。

2 質問「2」

- ・ (1)について

工事箇所につきましては、**別紙1**のとおりです。

- ・ (2), (3)について

工事ごとの地権者数と起工承諾数、土地売買契約、物件補償契約済の数、年度末の進捗率の見込み、対応策につきましては、**別紙2**のとおりです。

3 質問「3」

- ・ (1)について

詳細設計につきましては平成30年3月までに全て完了しております。

用地測量、物件調査につきましては平成31年3月末までの完了を予定しております。

- ・ (2)について

平成31年1月末現在で38件の契約を締結しております。

- ・ (3)について

「宇都宮市用地事務処理要領」第5条ただし書きに該当しておりますので、違反しておりません。


- ・ (4)について

工事につきましては、速やかな事業実施のため、起工承諾書を徴取し、進めてきたところであり、引き続き、用地取得に取り組み、着実な整備に努めてまいります。

- ・ (5)について

工事発注につきましては、本市の判断において起工承諾書を徴取し、実施しております。

平面図

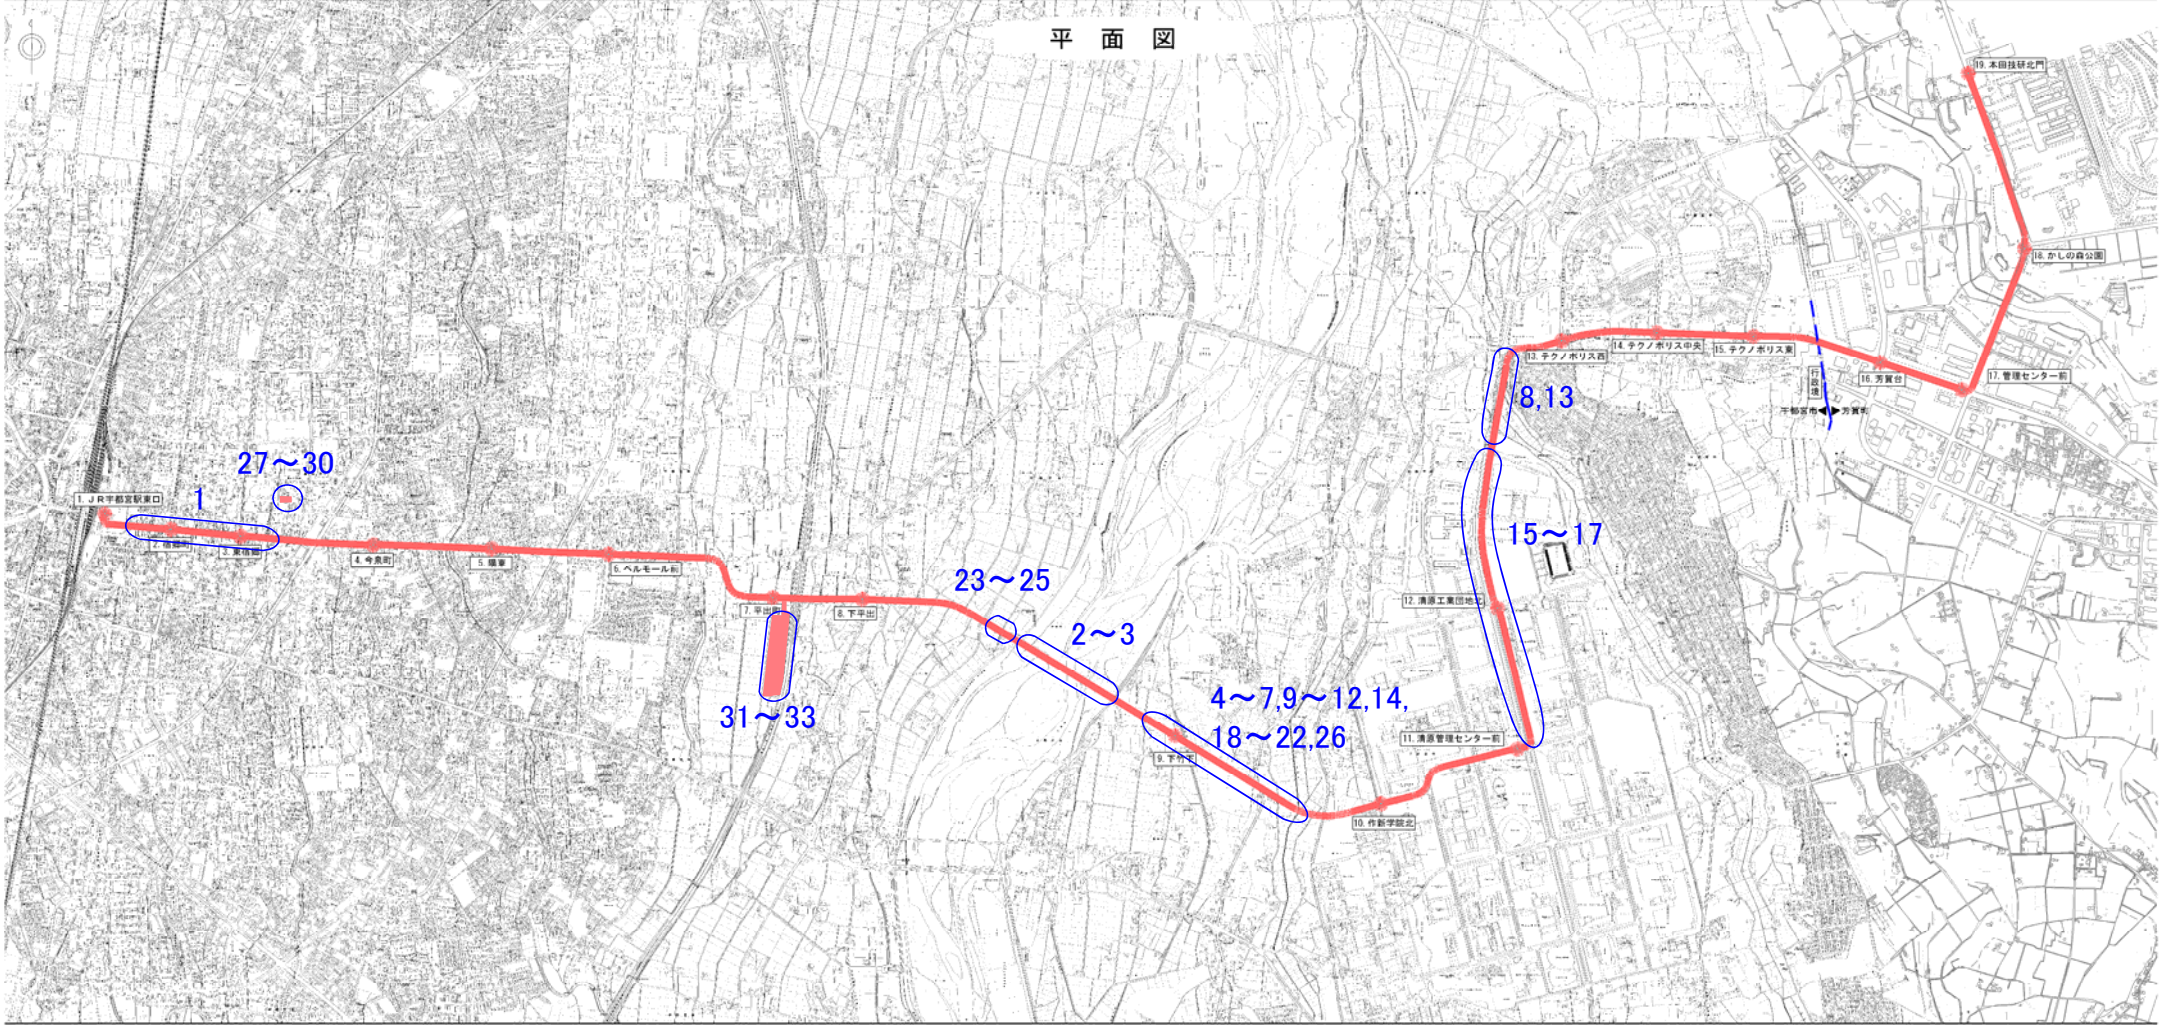

平成30年10月末現在LRT建設工事

NO.	補助 年度	工事名	地権者数	起工承諾者数	土地売買契約・ 物件補償契約済数 (平成31年1月末日)	進捗率 (平成31年3月末日)	今後の対応 (例)事故繰越対応など
1	29	道路改良工事	0	0	0	100%	
27	30	今泉変電所 新築その他工事	0	0	0	100%	
28	30	今泉変電所 新築受変電設備工事				35%	繰越予定
29	30	今泉変電所 新築空調設備工事				100%	
30	30	今泉変電所 新築電気設備工事				10%	繰越予定
31	30	L R T車両基地造成工事 (分割 1号)	7	6	1	2%	繰越予定
32	30	L R T車両基地造成工事 (分割 2号)				2%	繰越予定
33	30	L R T車両基地造成工事 (分割 3号)				100%	
23	30	道路築造工事 (分割 7号)	5	5	4	100%	
24	30	下平出第1高架橋工事 (分割 1号)				2%	繰越予定
25	30	下平出第2高架橋工事 (分割 1号)				2%	繰越予定
2	30	鬼怒川橋梁工事 (分割 1号)	7	7	2	29%	繰越予定
3	29	鬼怒川橋梁工事 (分割 2号)				100%	
4	30	下竹下第3高架橋工事 (分割 1号)	20	20	12	42%	繰越予定
5	30	下竹下第3高架橋工事 (分割 2号)				3%	繰越予定
6	30	下竹下第4架道橋工事 (分割 1号)				3%	繰越予定
7	30	下竹下第2高架橋工事 (分割 1号)				2%	繰越予定
9	30	鬼怒川左岸第2工区 地盤改良工事 (分割 1号)				25%	繰越予定
10	30	鬼怒川左岸第2工区 地盤改良工事 (分割 2号)				90%	繰越予定
11	30	道路築造工事 (分割 1号)				100%	
12	30	道路築造工事 (分割 2号)				100%	
14	30	下竹下第1架道橋工事 (分割 1号)				3%	繰越予定
18	30	道路築造工事 (分割 4号)	100%				
19	30	道路築造工事 (分割 5号)	5%	繰越予定			
20	30	鬼怒川左岸第1工区 擁壁工事 (分割 1号)	1%	繰越予定			
21	29	鬼怒川左岸第1工区擁壁工事 (分割 2号)	100%				
22	30	道路築造工事 (分割 6号)	100%				
26	30	下竹下第3架道橋工事	1%	繰越予定			
15	29	清原第2工区道路改良工事 (分割 1号)	0	0	0	100%	
16	29	清原第2工区道路改良工事 (分割 2号)				100%	
17	29	清原第2工区道路改良工事 (分割 3号)				100%	
8	30	野高谷第1架道橋工事 (分割 1号)	4	4	3	3%	繰越予定
13	29	道路築造工事 (分割 3号)				100%	

※1 地権者が複数の工事箇所に土地を所有している場合があるため、地権者数、起工承諾者数、契約数は「のべ人数」である。

※2 地権者数、起工承諾者数、土地・補償契約者数については、個人の特定につながることを無きよう、一定の工事をまとめて記載。
