


(仮称)第2エコパーク建設工事の進捗状況(9月末時点)



全体写真(航空写真)



埋立地の造成が進み、埋立地の形が見えてきました。

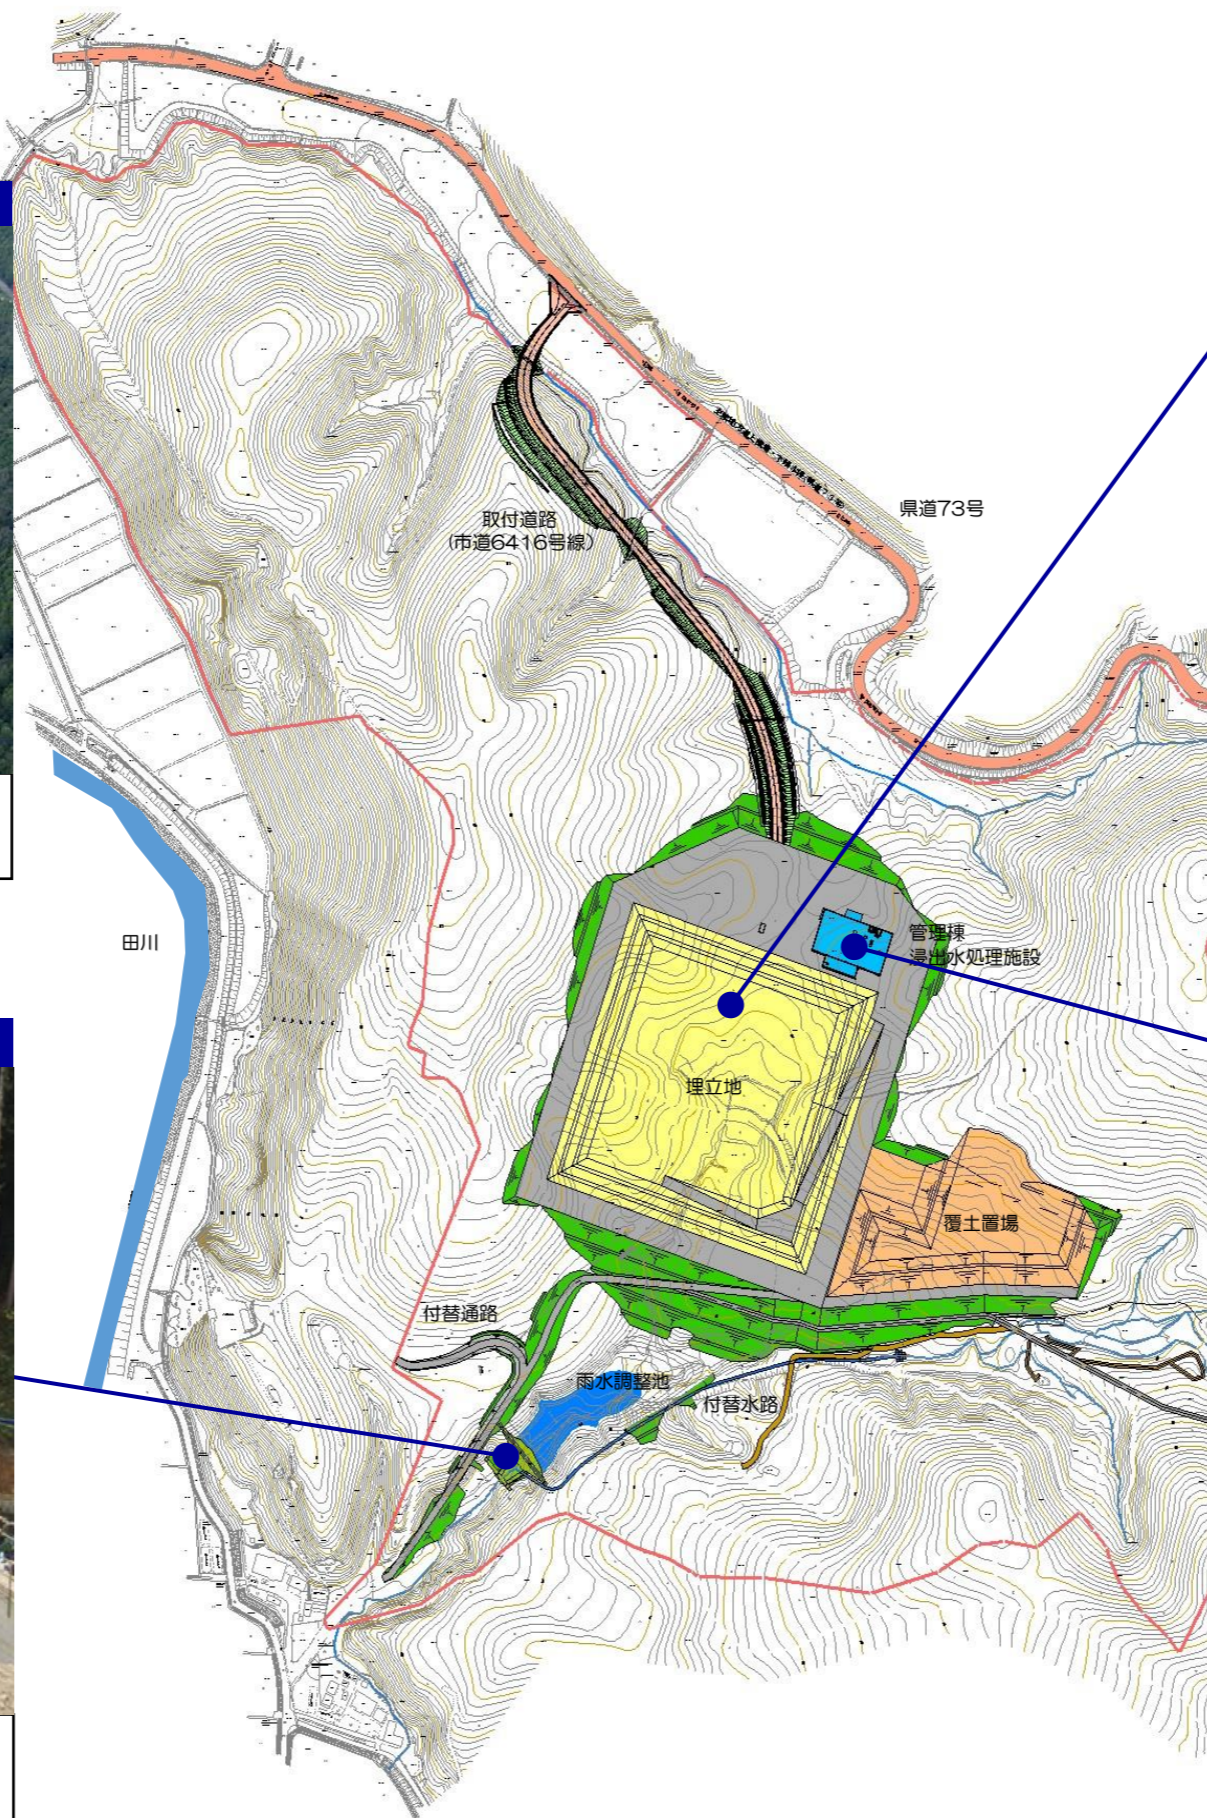

埋立地造成工事



埋立地の底面まで掘削が進みました。現場で発生した岩を盛土として利用するため破碎処理を行っております。

雨水調整池堰堤工事



水の勢いを弱める水叩き工が完成しました。引き続き、水路の築造を行っております。

管理棟・浸出水処理施設工事



管理棟地下水槽部の埋戻しが完了しました。
